

**EUROVIA**

**SITUATION** Commune du Taillan - Médoc

**PROJET** Avenue de Soulac

**MODIFICATIONS**

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

Domaine de Bellevue  
20, Rue Thierry SABINE  
BP 60140  
33706 MERIGNAC CEDEX  
Tél 05.57.29.04.60  
Fax 05.57.29.04.61


**MOA** BORDEAUX METROPOLE 10 - 12 Rue des Sablons, 33185 Le Haillan

**MOE** VERDI

**IND** A

**EXE** EXECUTION


**PHASE(1.1)** **200<sup>e</sup>**

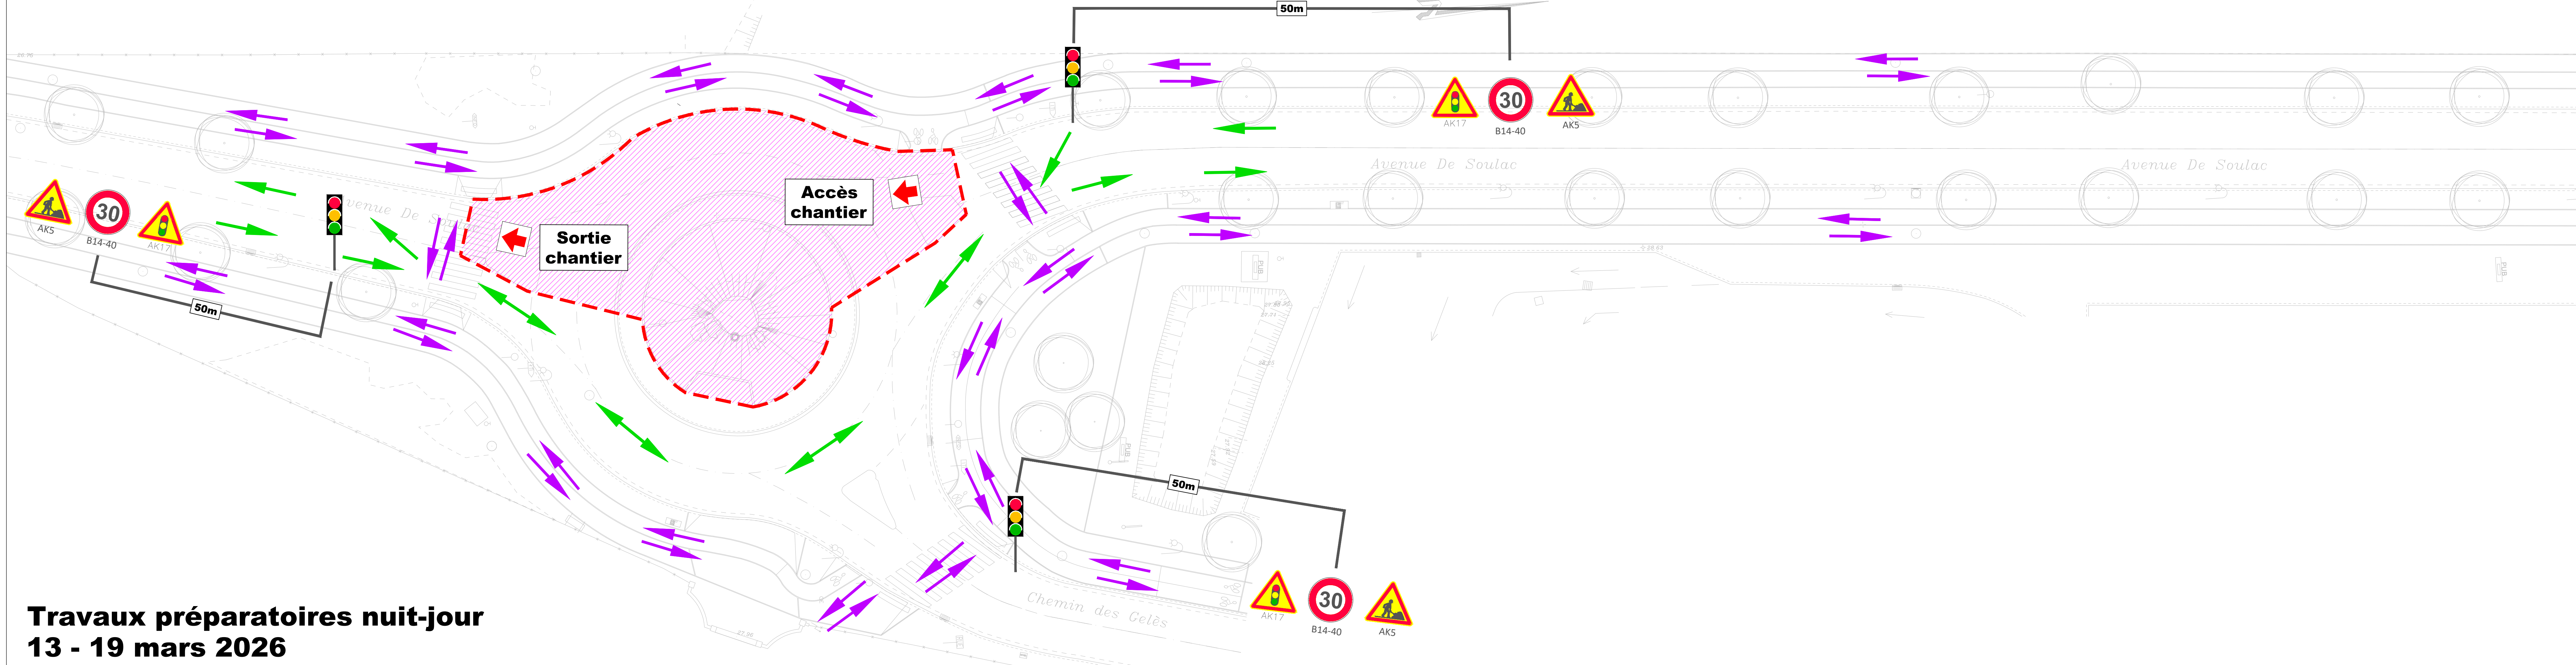

**Travaux préparatoires nuit-jour**  
**13 - 19 mars 2026**

**LEGENDE**

- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

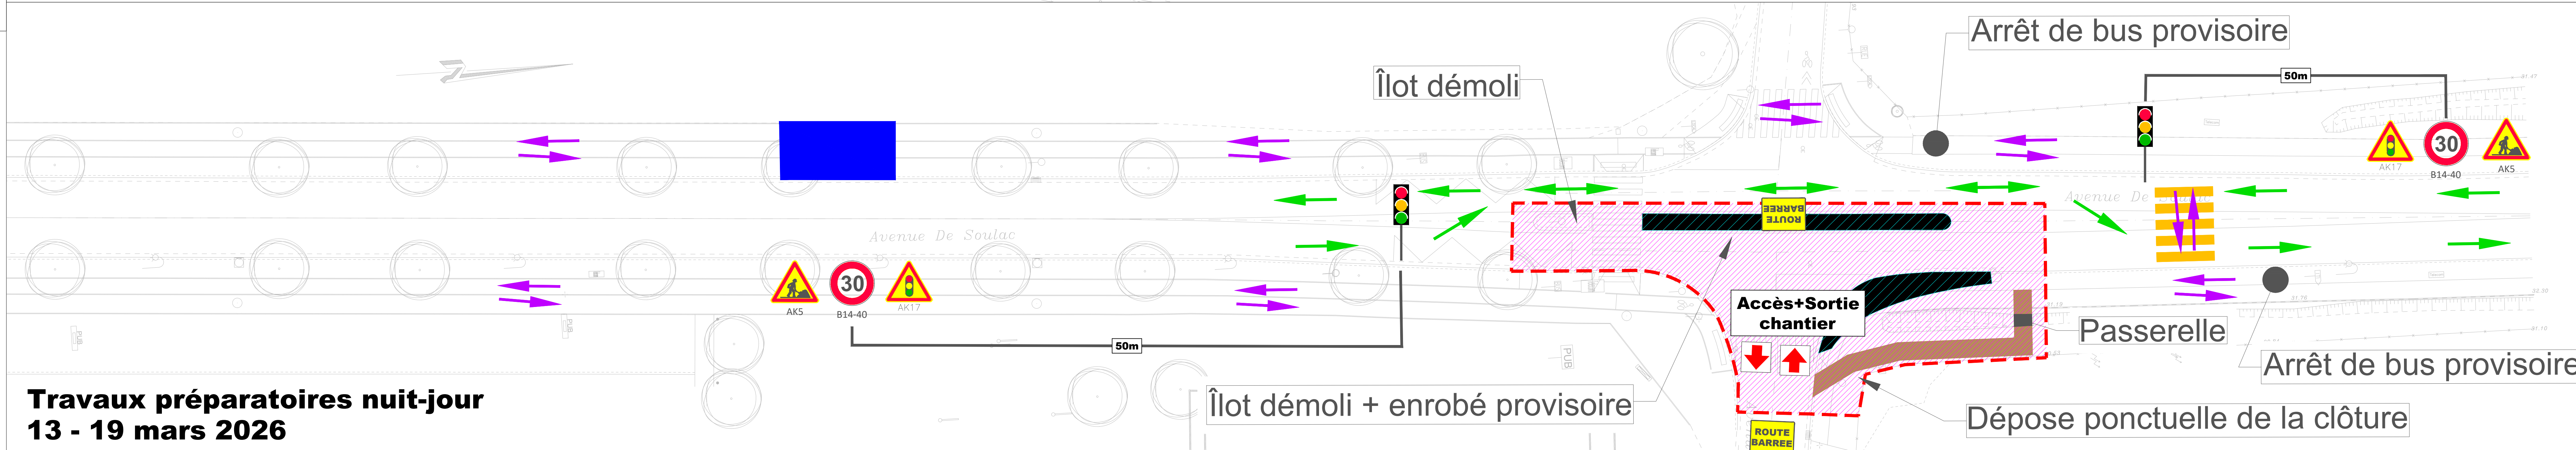

**Travaux préparatoires nuit-jour**  
**13 - 19 mars 2026**

MODIFICATIONS

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

Domaine de Bellevue  
20, Rue Thierry SABINE  
BP 60140  
33706 MERIGNAC CEDEX  
Tél 05.57.29.04.60  
Fax 05.57.29.04.61

MDA  
BORDEAUX METROPOLE  
10 - 12 Rue des Sablons,  
33185 Le Haillan


MOE  
VERDI  
BUREAU D'ETUDES

IND  
A  
EXE  
EXECUTION

RESUME PAR  
DLR  
FICHER  
LE TAILLAN AVENUE DE SOULAC-200305.DWG

SUIVRE PAR  
ESN  
REFERENCES


**PHASE(1.2)** **200<sup>e</sup>**

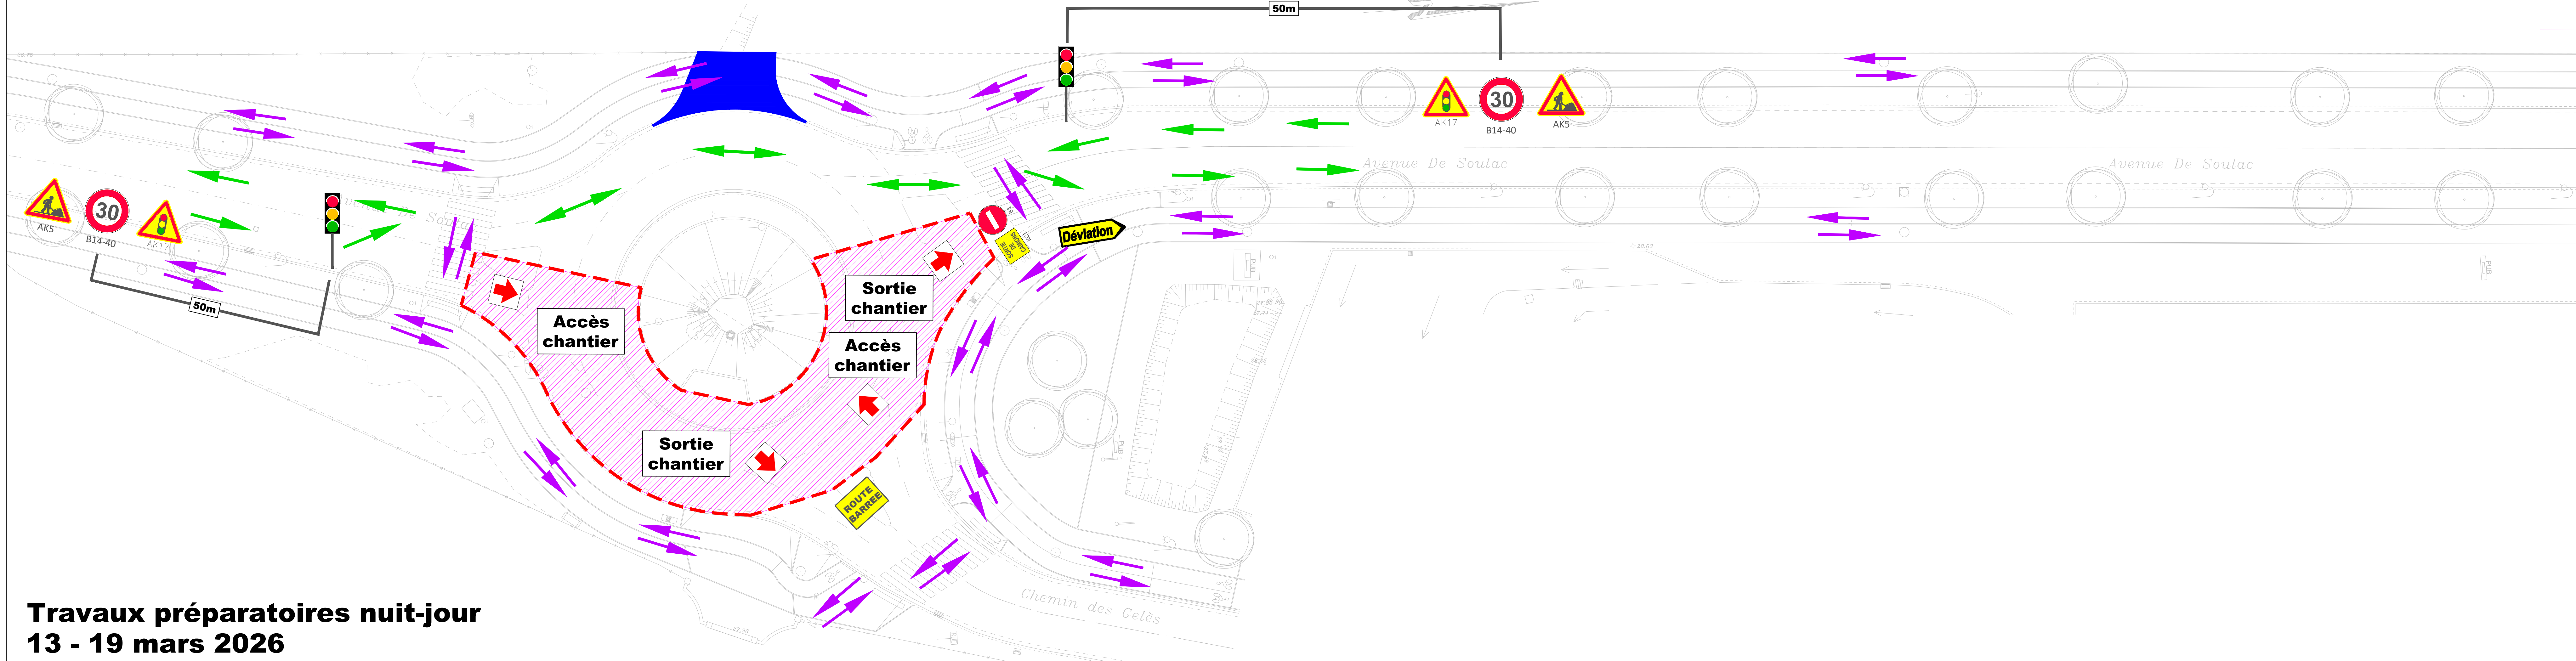

**Travaux préparatoires nuit-jour**  
**13 - 19 mars 2026**

**LEGENDE**

- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

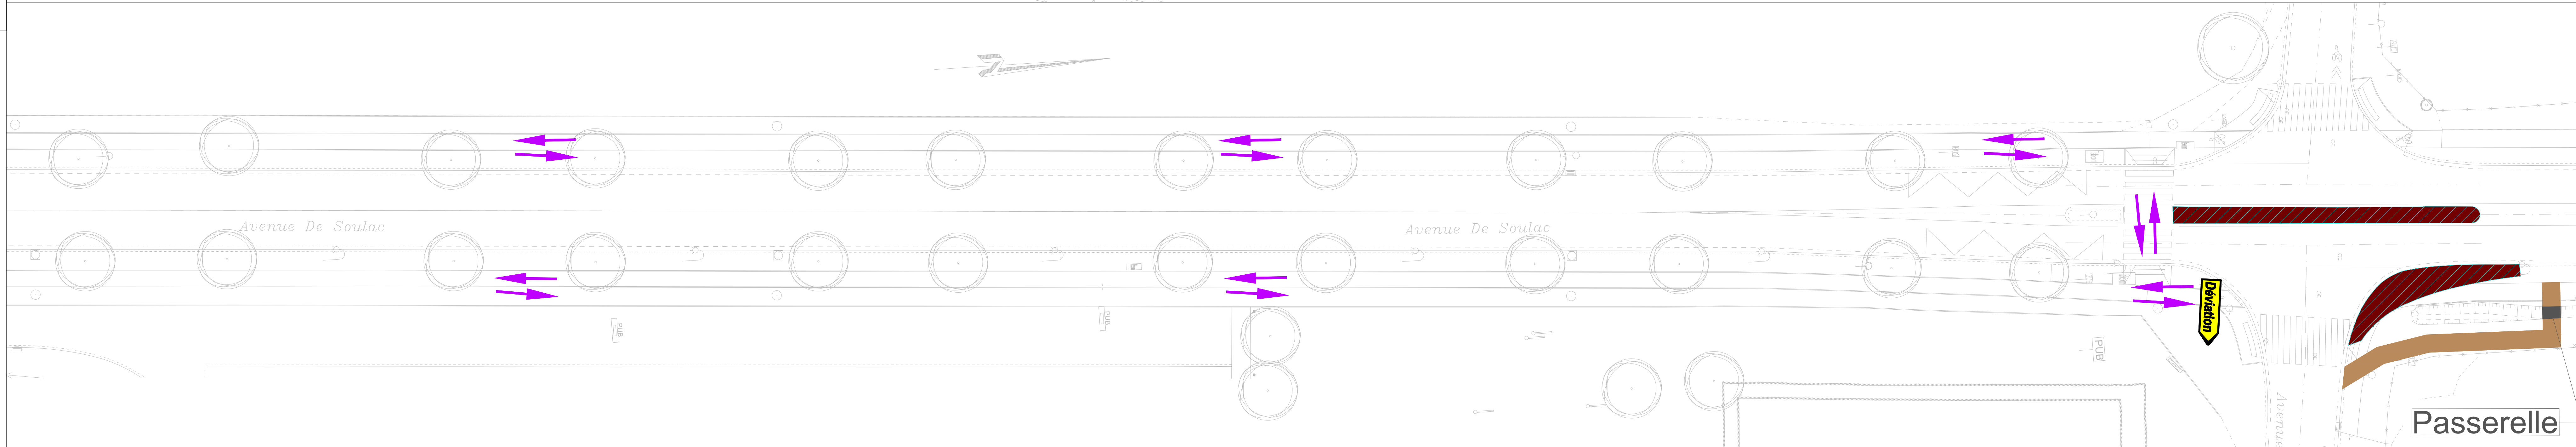

MODIFICATIONS

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

Domaine de Bellevue  
20, Rue Thierry SABINE  
BP 60140  
33706 MERIGNAC CEDEX  
Tél 05.57.29.04.60  
Fax 05.57.29.04.61

MOA  
BORDEAUX METROPOLE  
10 - 12 Rue des Sablons,  
33185 Le Haillan


MOE  
VERDI  
Bureau de construction

IND  
A  
EXE  
EXECUTION

RESSOURCE PAR  
DLR  
FICHIER  
LE TAILLAN AVENUE DE SOULAC - 200305.DWG

SUIVRE PAR  
ESN  
REFERENCES

**PHASE(2)** **200<sup>e</sup>**

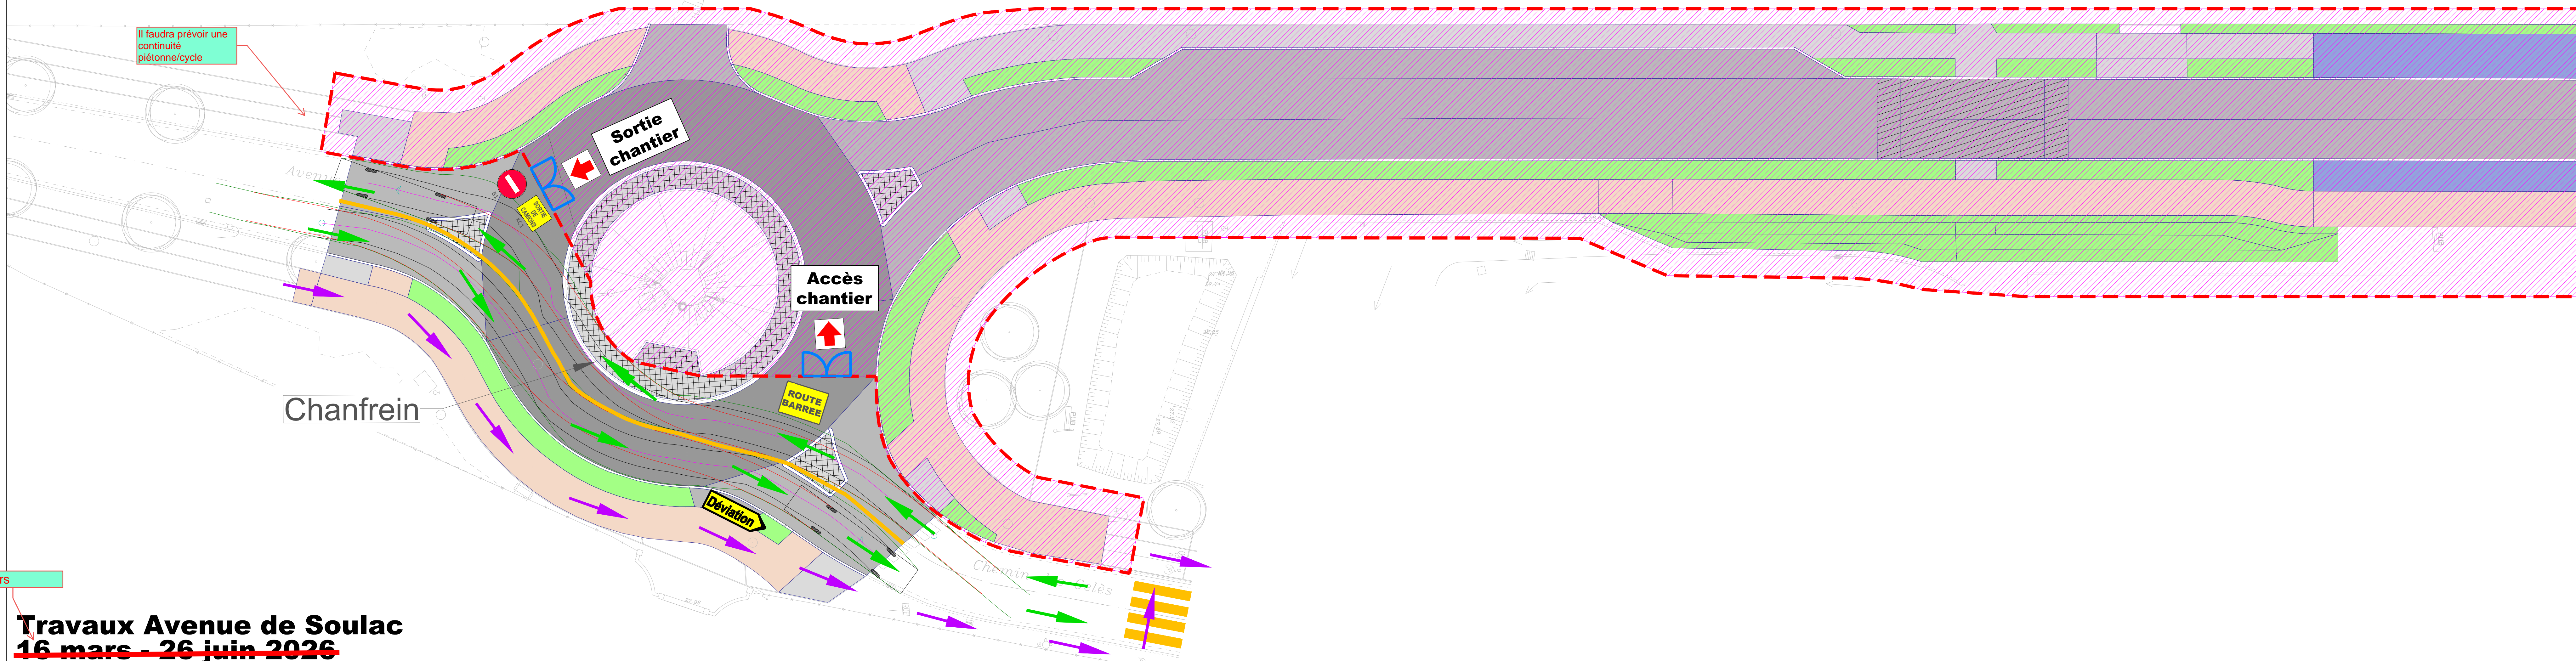

19 mars

**Travaux Avenue de Soulac**  
~~16 mars - 26 juin 2026~~

9 juin d'après  
planning

**LEGENDE**


- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail


19 mars

**Travaux Avenue de Soulac**  
~~16 mars - 26 juin 2026~~


9 juin d'après  
planning

Accès compagne garantie garantie depuis carrefour

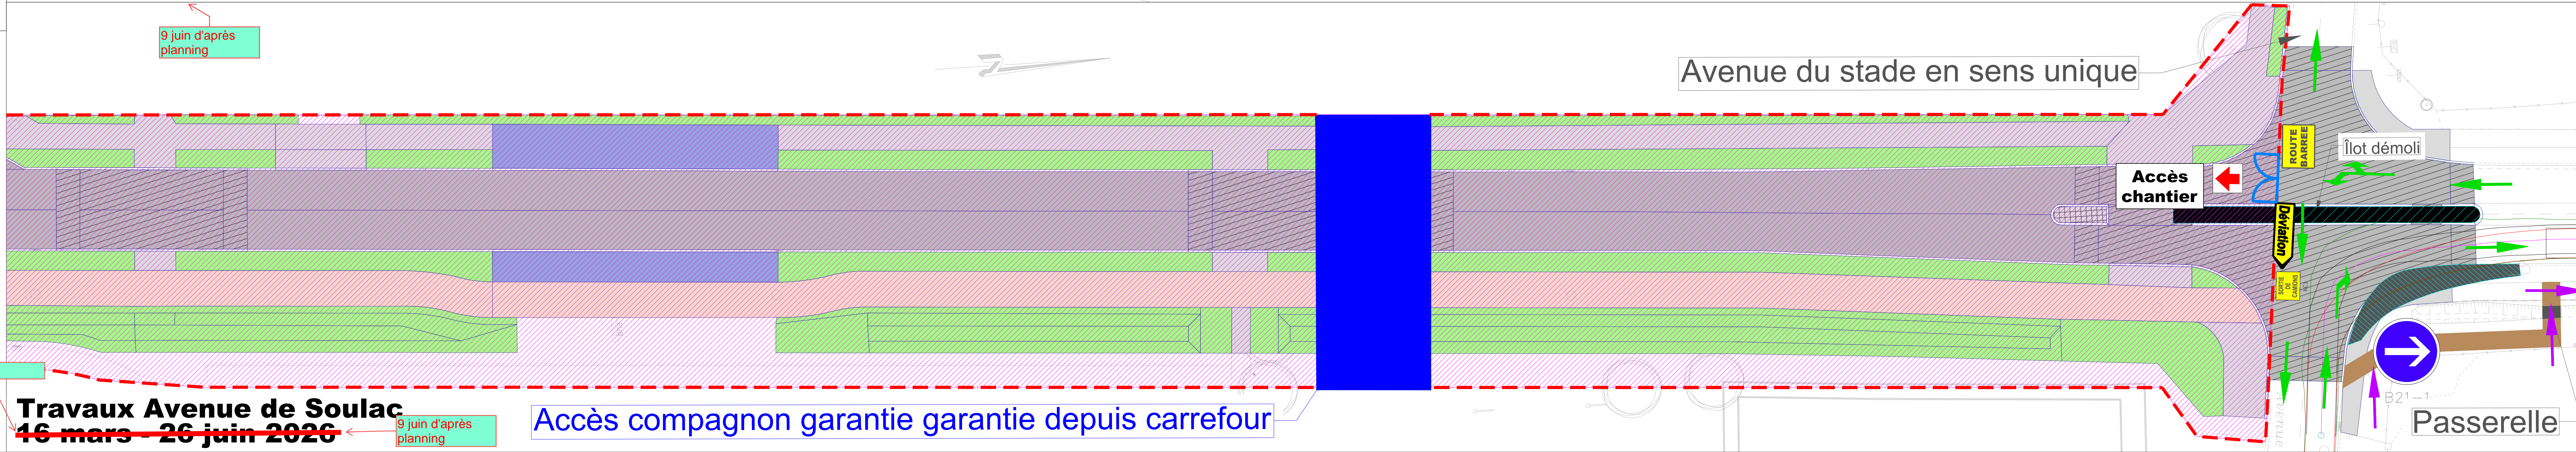

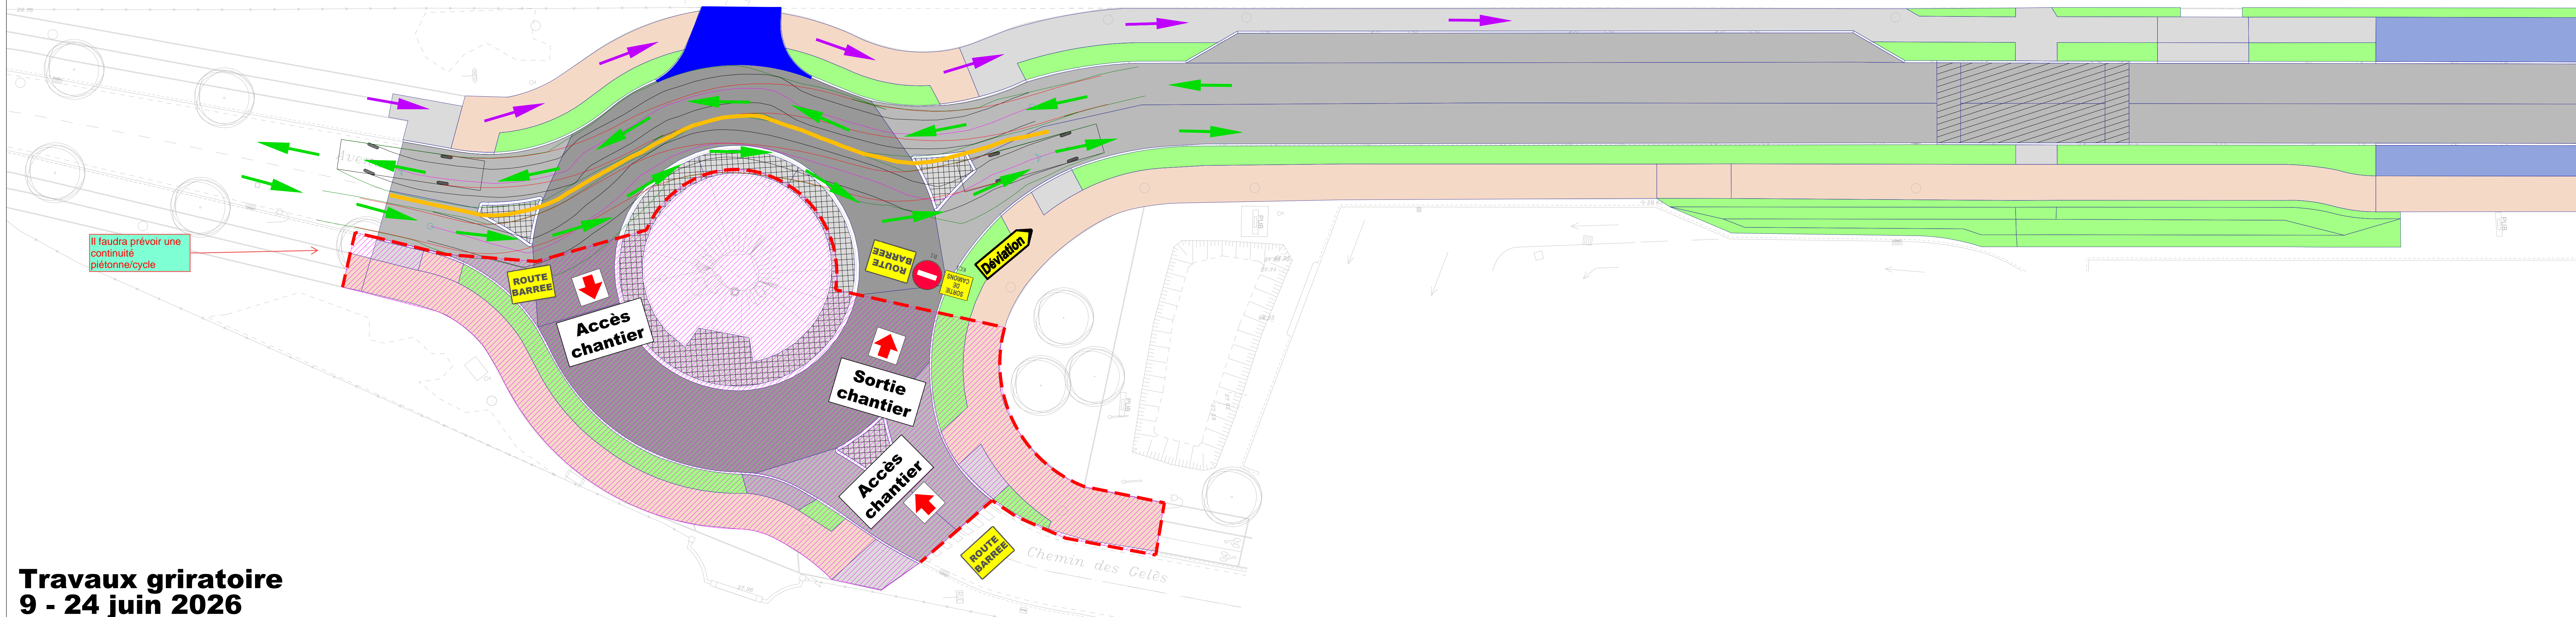

- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

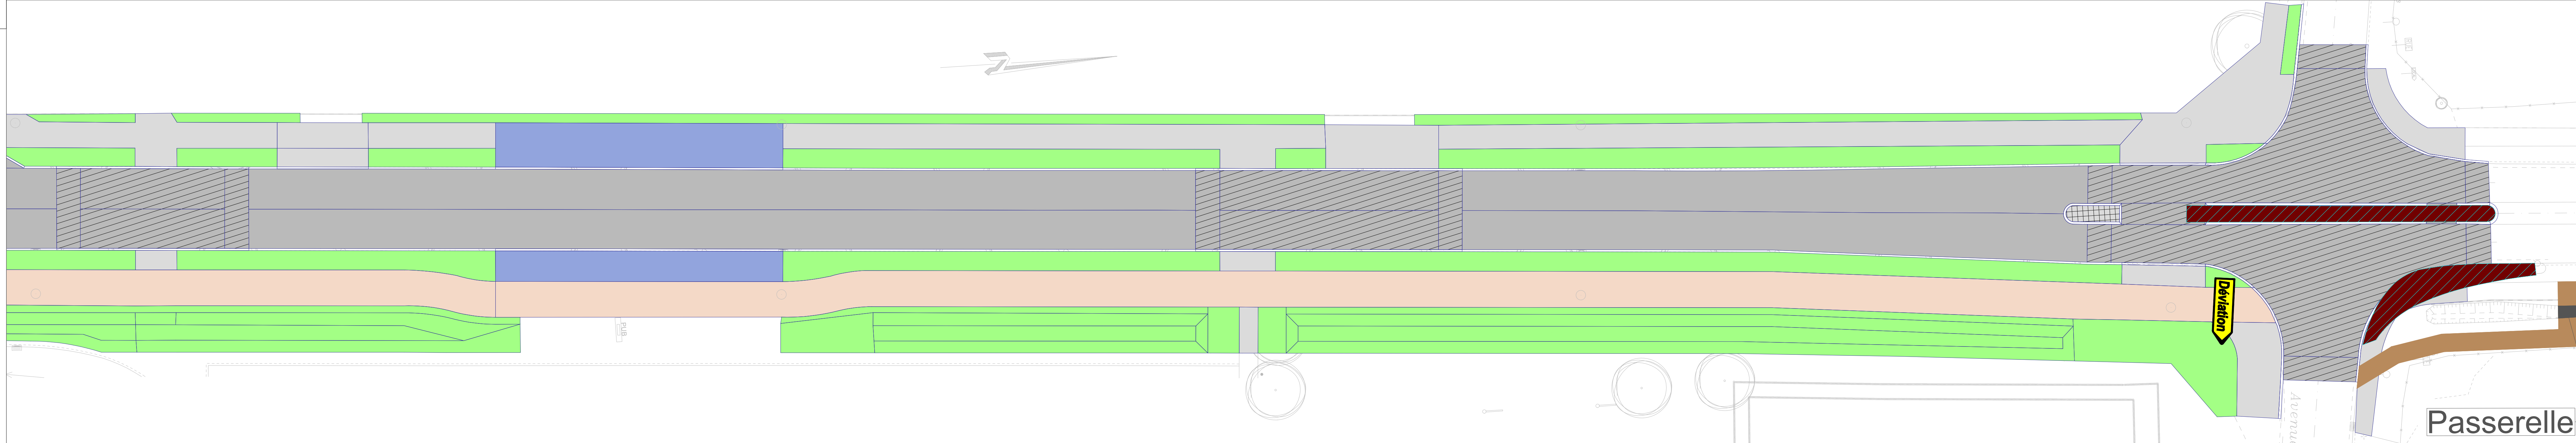

Commune du Taillan - Médoc

Avenue de Soulac

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

Domaine de Bellevue  
20, Rue Thierry SABINE  
BP 60140  
33706 MERIGNAC CEDEX  
Tél 05.57.29.04.60  
Fax 05.57.29.04.61

IND  
**A**  
EXE  
EXECUTION



MOA  
BORDEAUX METROPOLIE  
10 - 12 Rue des Sablons,  
33185 Le Haillan

MOE  
VERDI  
Design de chantier

RESSURCE PAR  
DLR  
FICHER  
LE TAILLAN AVENUE DE SOULAC-200305.DWG  
REFERENCES  
ESN

PHASE(3.2)

200<sup>e</sup>

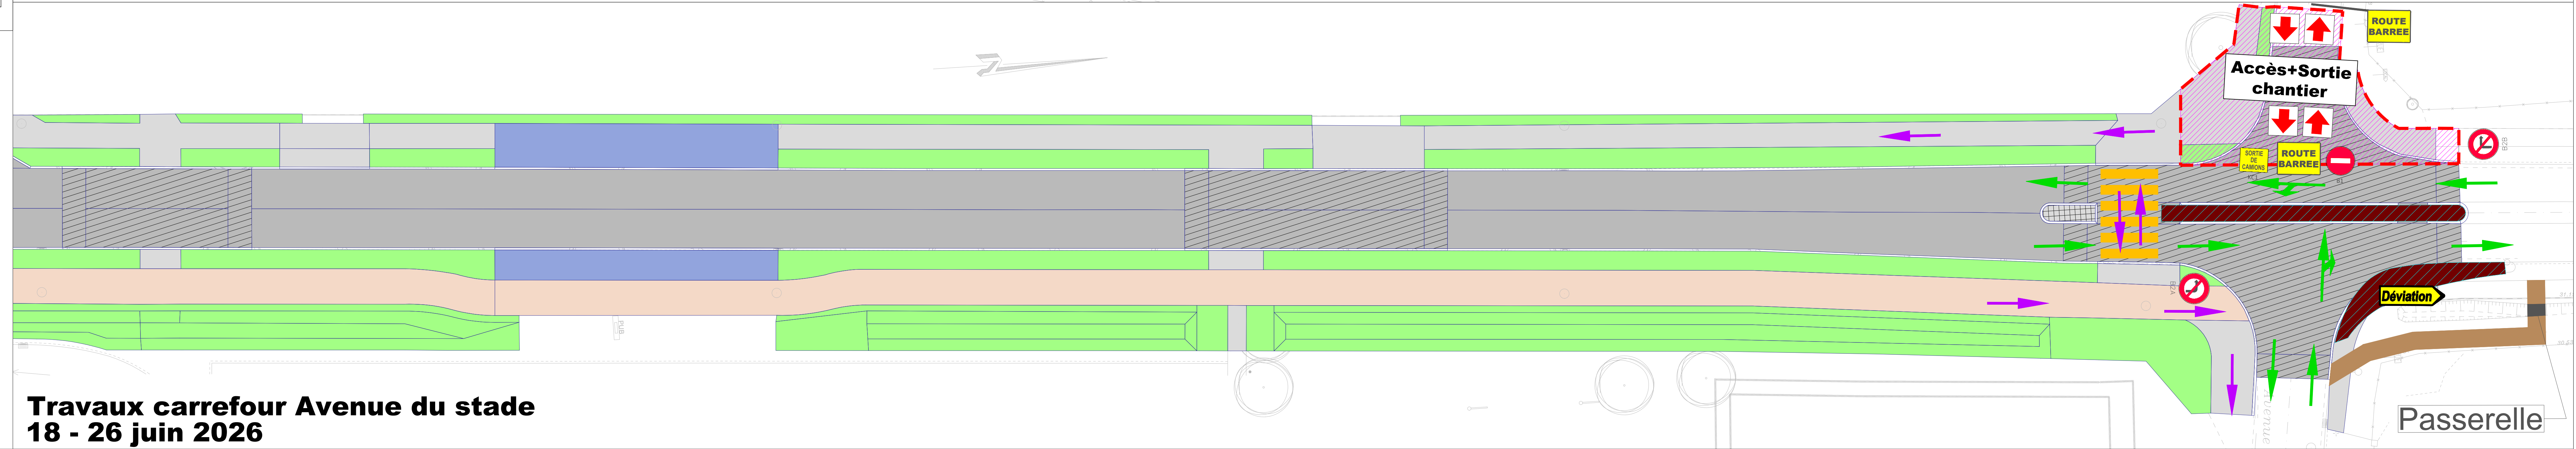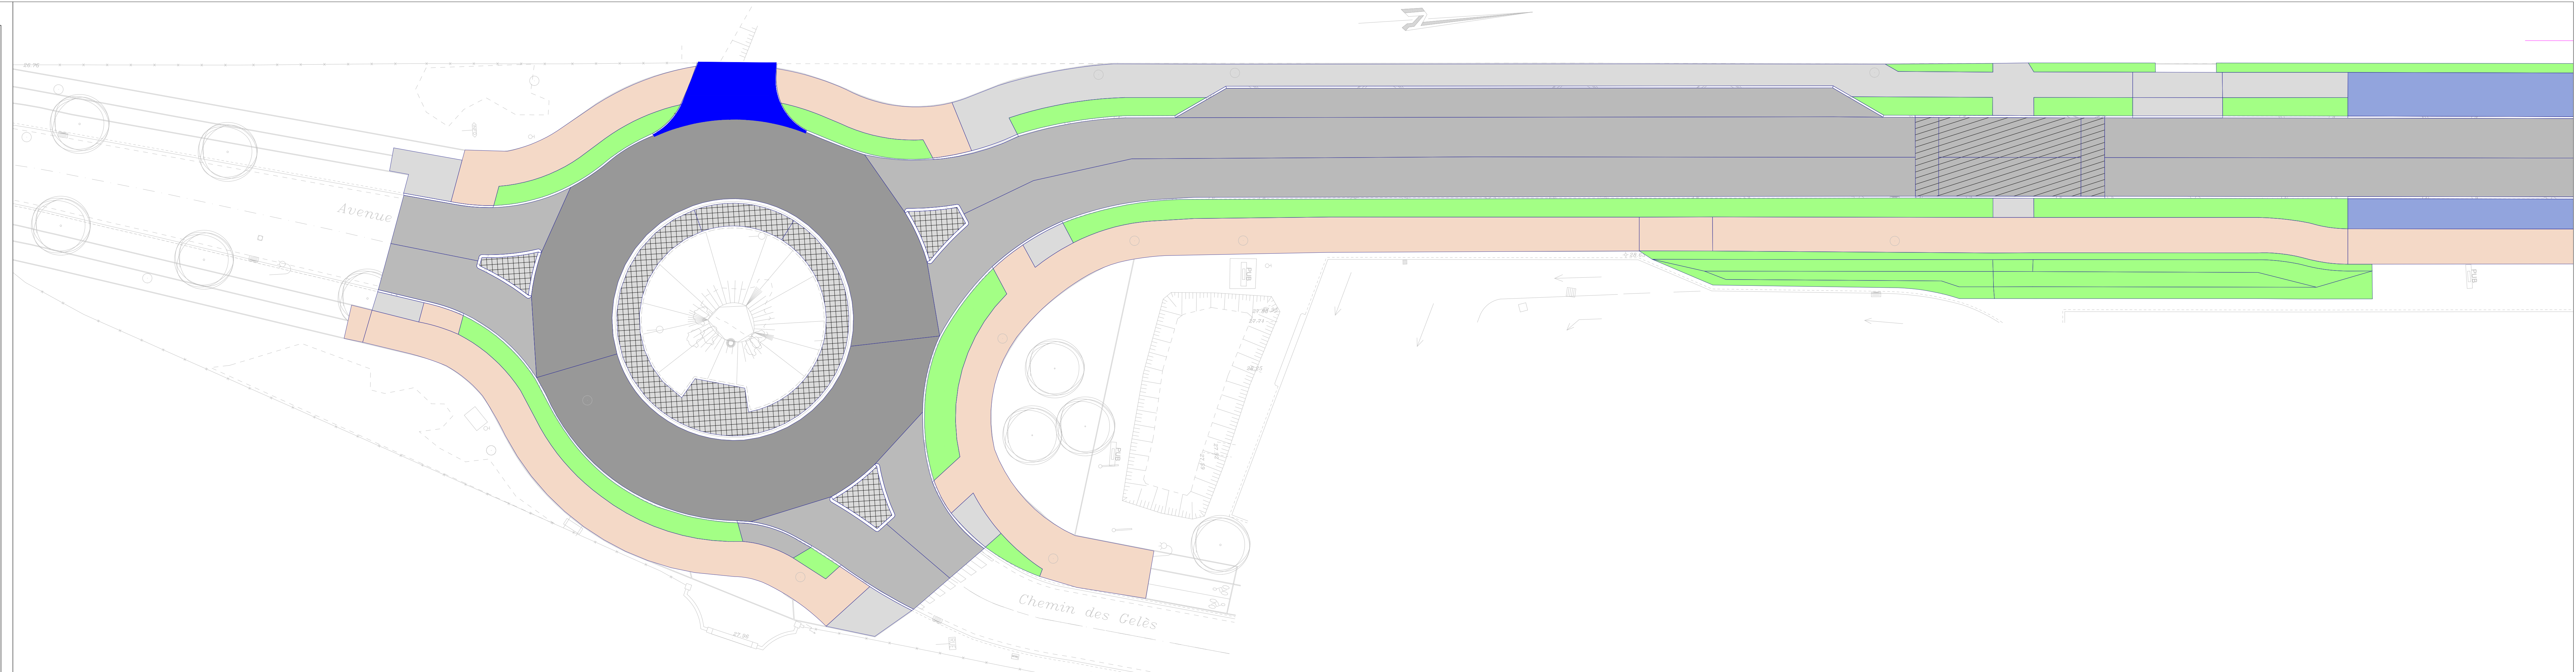






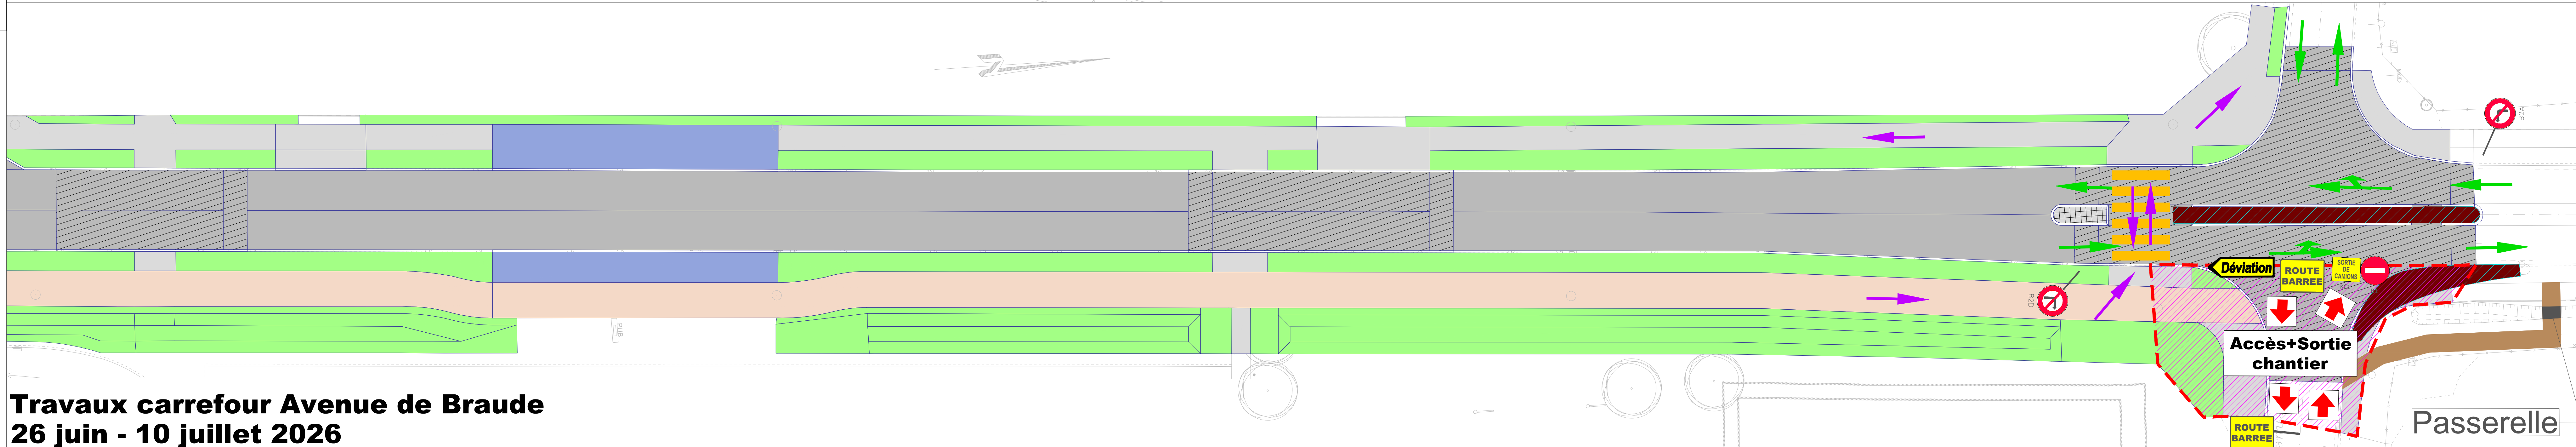
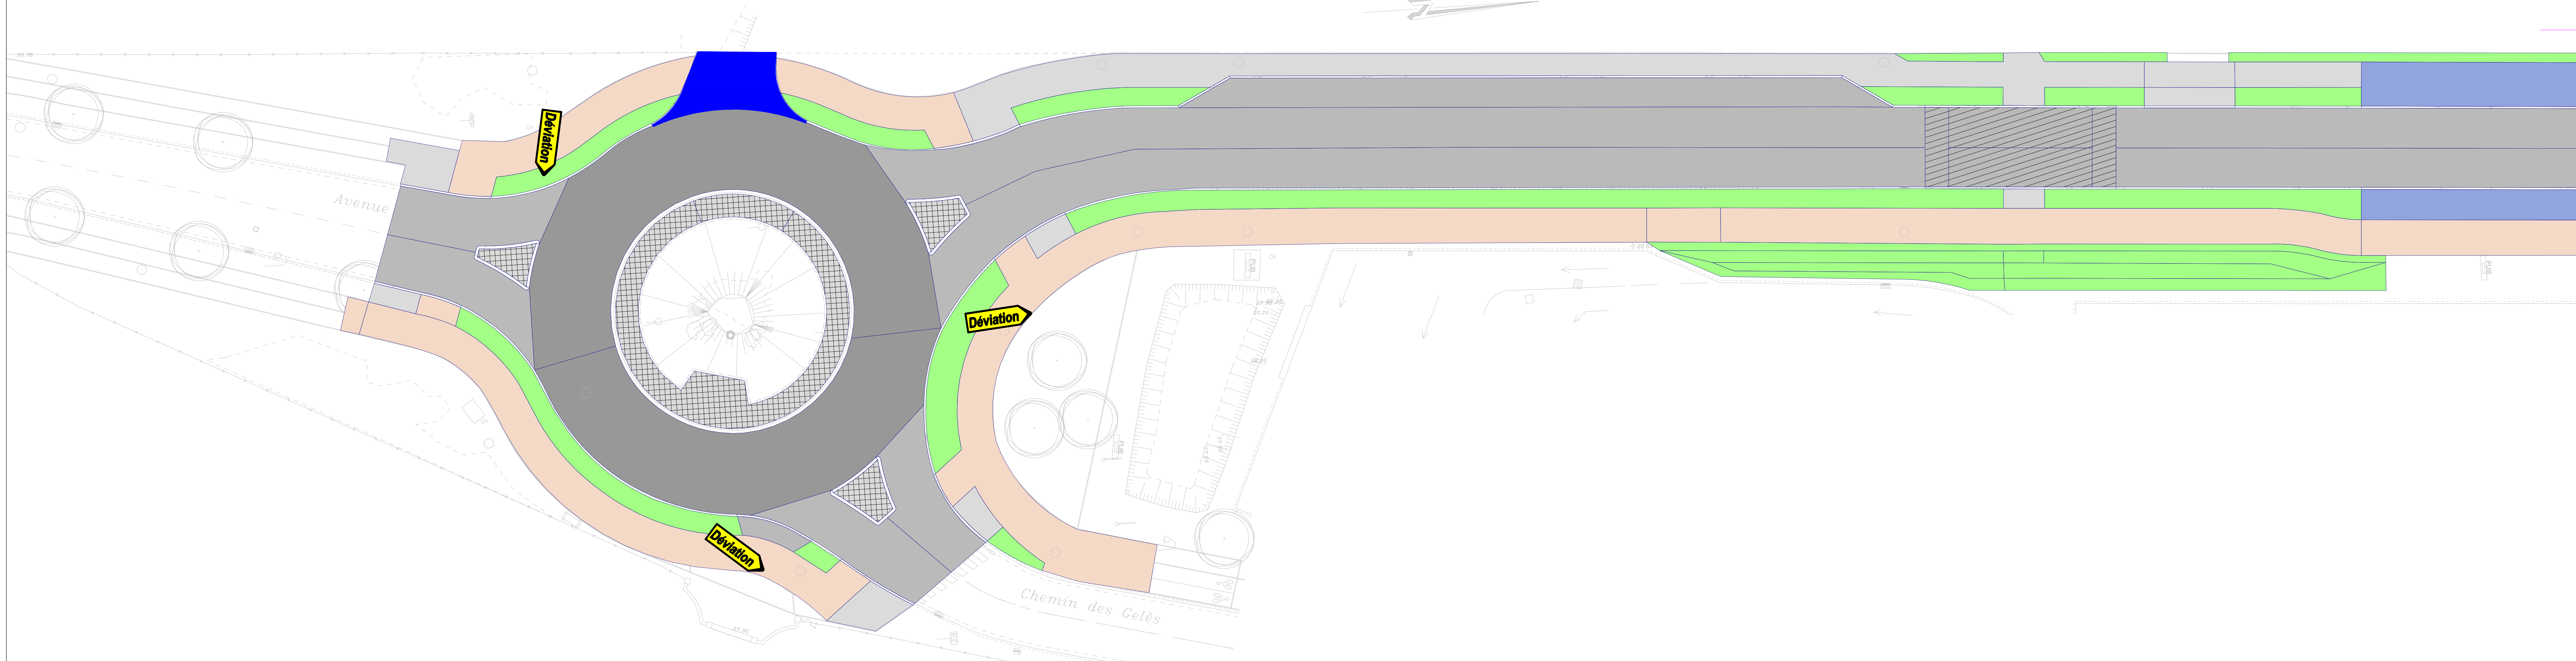
Travaux carrefour Avenue du stade  
18 - 26 juin 2026

LEGENDE


- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

-  Emprise du chantier
-  Accès chantier à conserver
-  Enrobé provisoire
-  Cheminement piéton calcaire
-  Barrière chantier 1.10m
-  Balisettes K5C
-  Circulation
-  Cheminement piétons/vélos
-  Marquage provisoire
-  Portail




**Travaux carrefour Avenue de Braude**  
**26 juin - 10 juillet 2026**

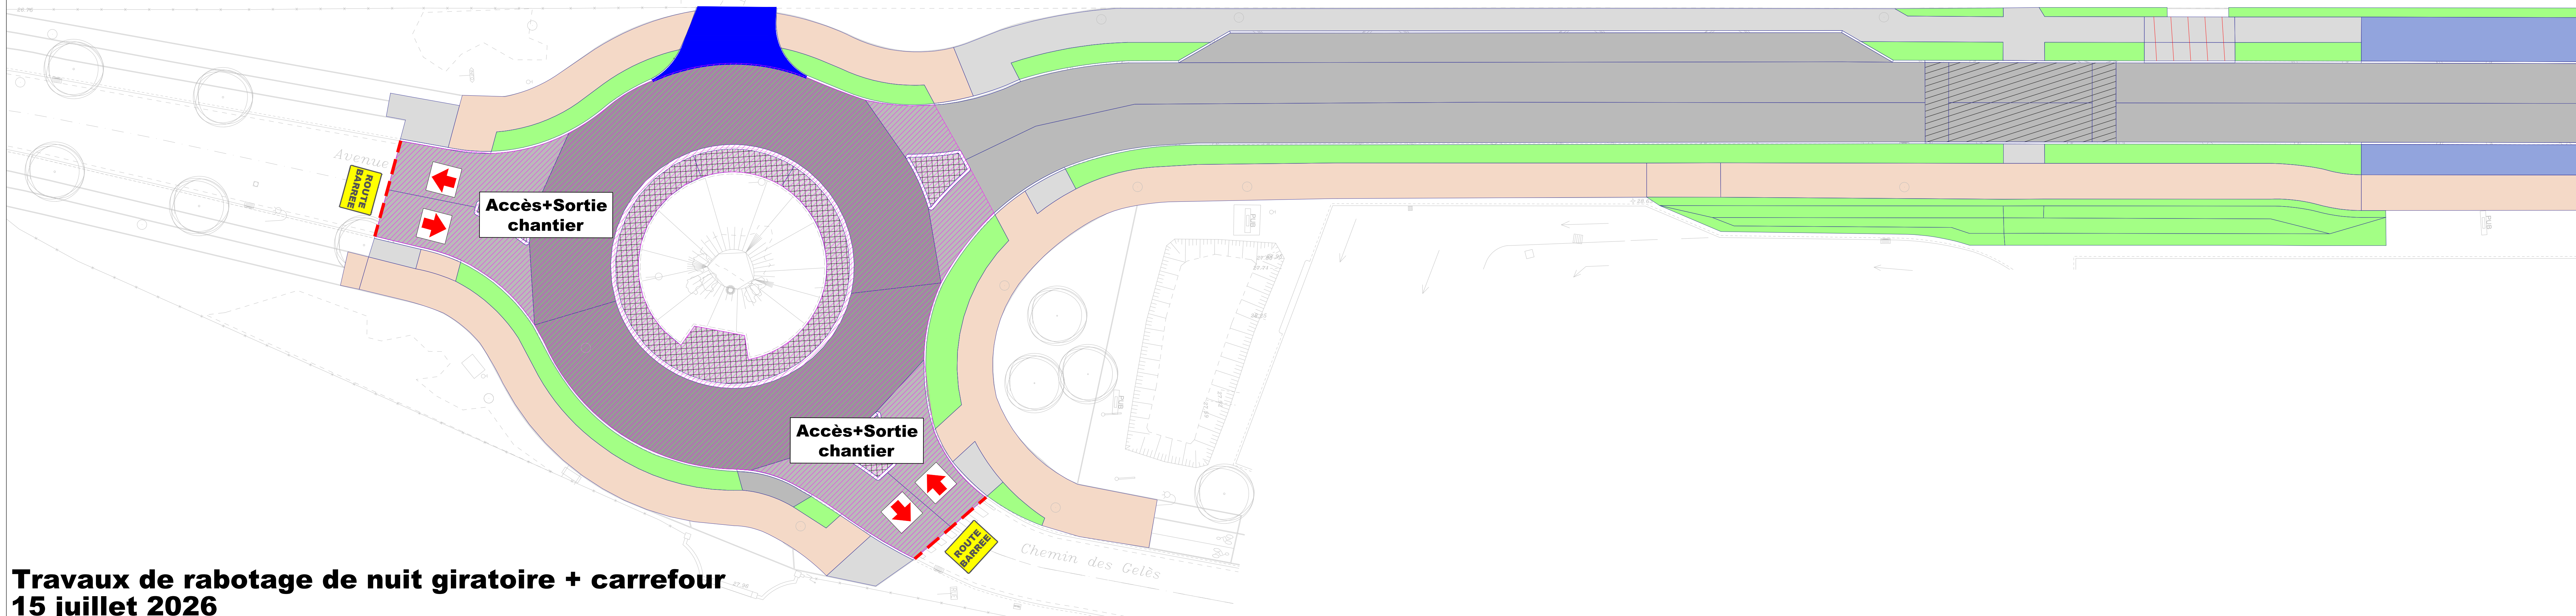

**Travaux de rabotage de nuit giratoire + carrefour**  
**15 juillet 2026**

- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

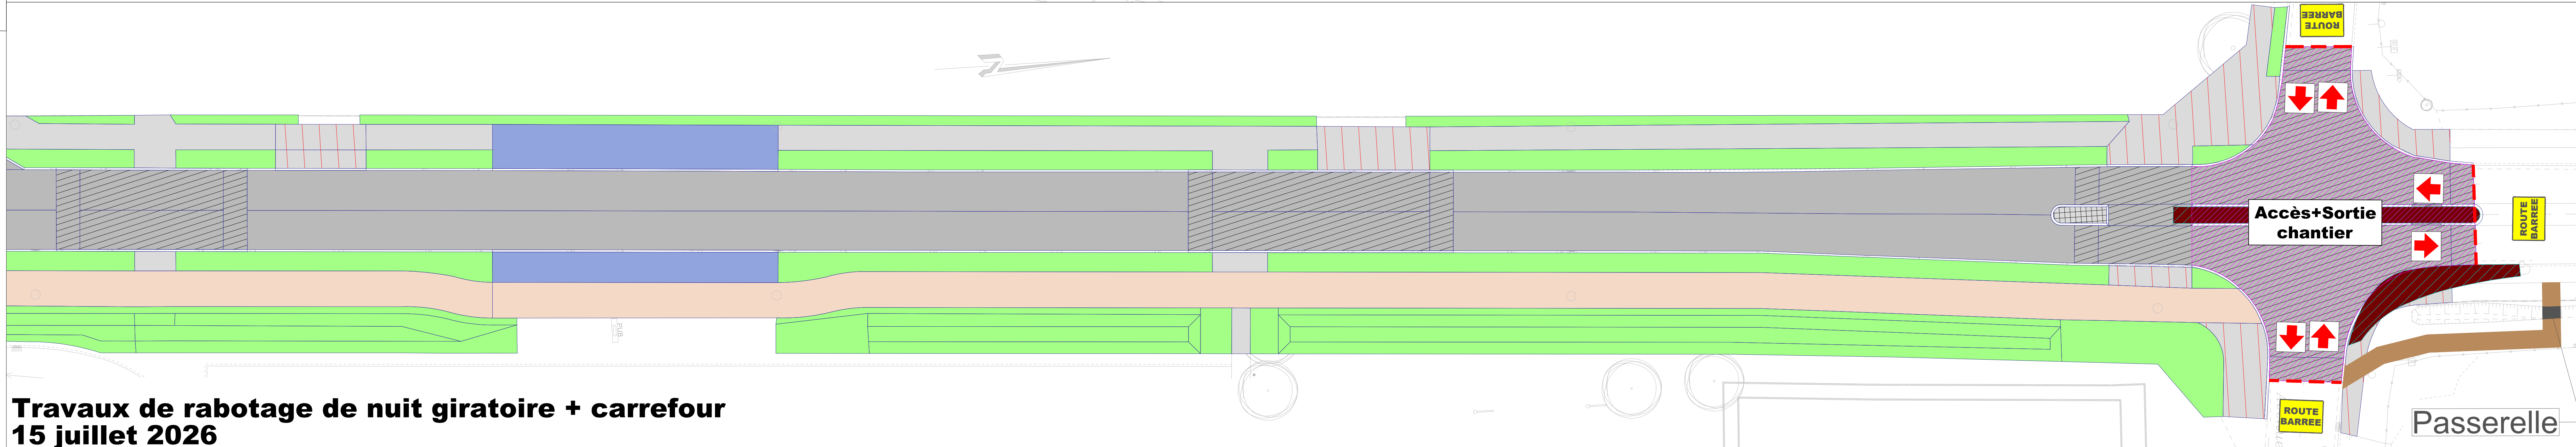

**Travaux de rabotage de nuit giratoire + carrefour**  
**15 juillet 2026**

Commune du Taillan - Médoc

Avenue de Soulac

1 Date Modifications


A 11/02/26 Edition initiale

Domaine de Bellevue  
20, Rue Thierry SABINE  
BP 60140  
33706 MERIGNAC CEDEX  
Tél 05.57.29.04.60  
Fax 05.57.29.04.61

BORDEAUX METROPOLE 10 - 12 Rue des Sablons, 33185 Le Haillan  
**MOE** VERDI *Design et construction*


**FICHER**  
LE TAILLAN AVENUE DE SOULAC-200305.DWG

DLR  
ESN

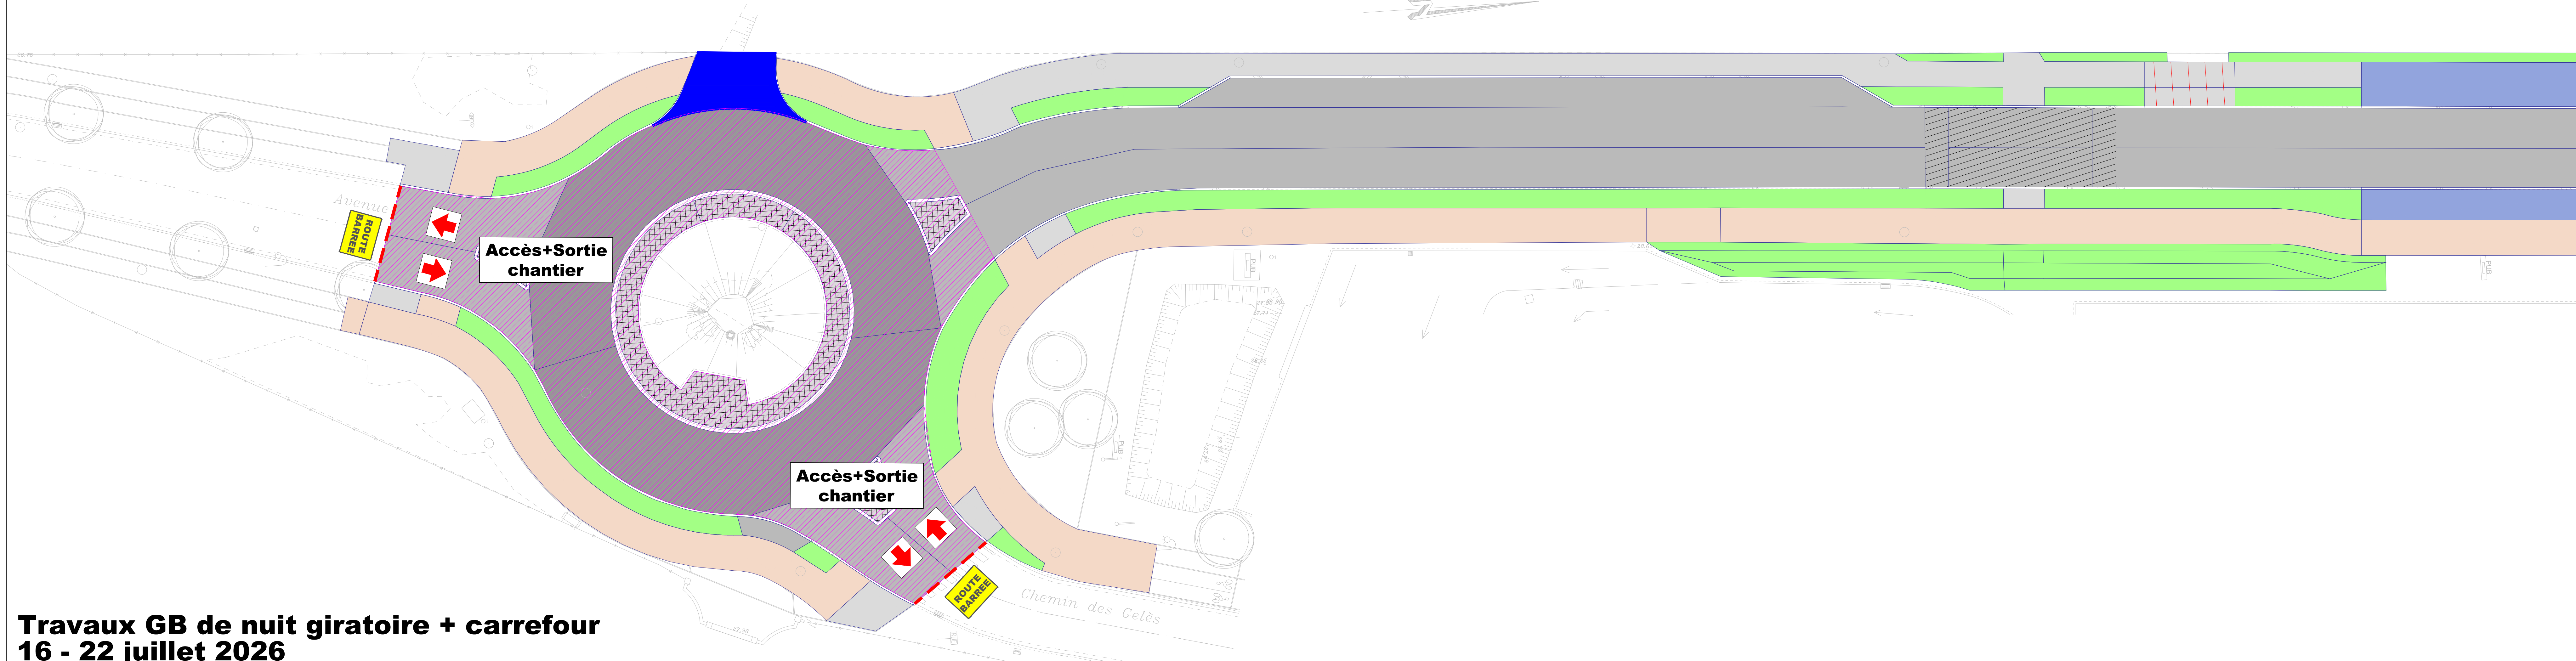


**Travaux GB de nuit giratoire + carrefour**  
**16 - 22 juillet 2026**

- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

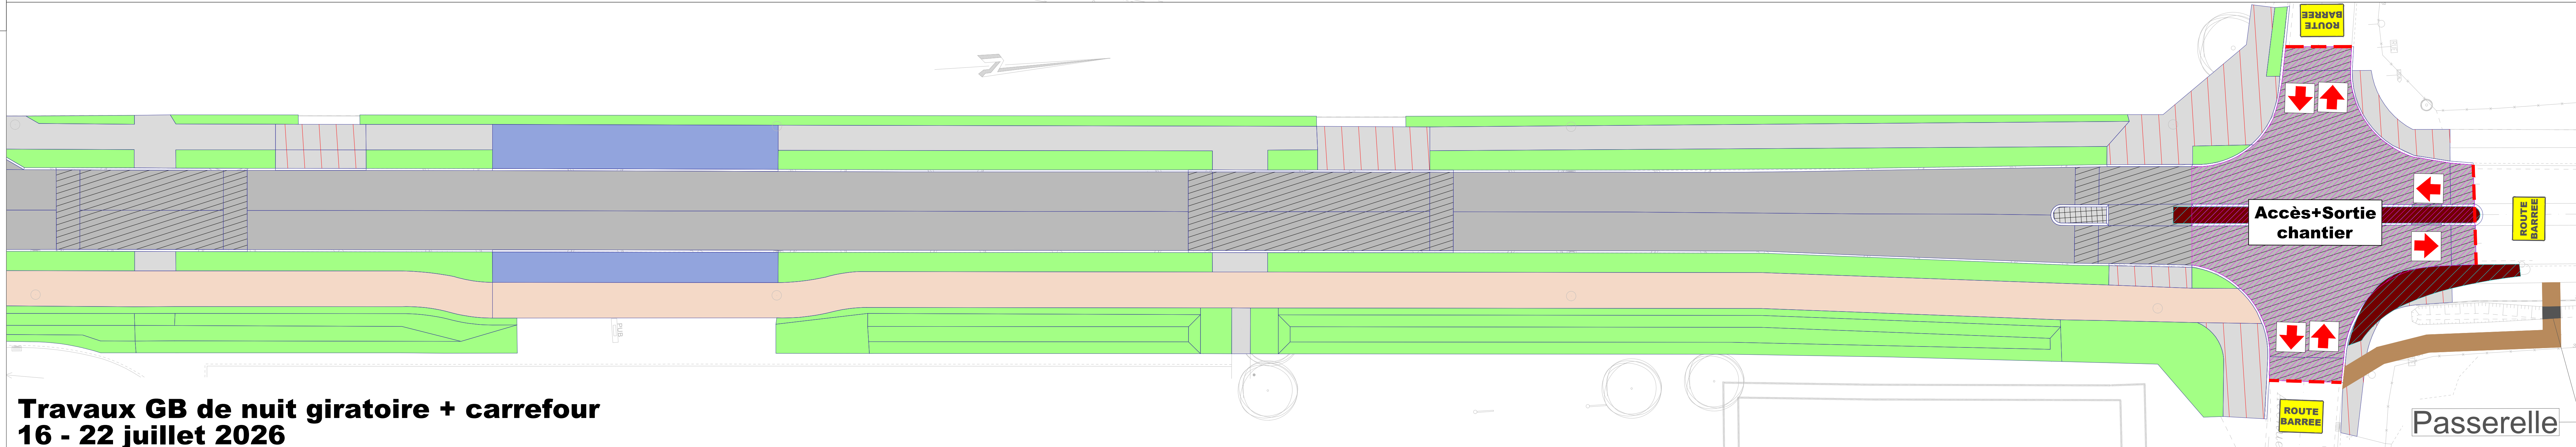


**Travaux GB de nuit giratoire + carrefour**  
**16 - 22 juillet 2026**

**Travaux de nuit pour BBME  
16 - 22 juillet 2026**

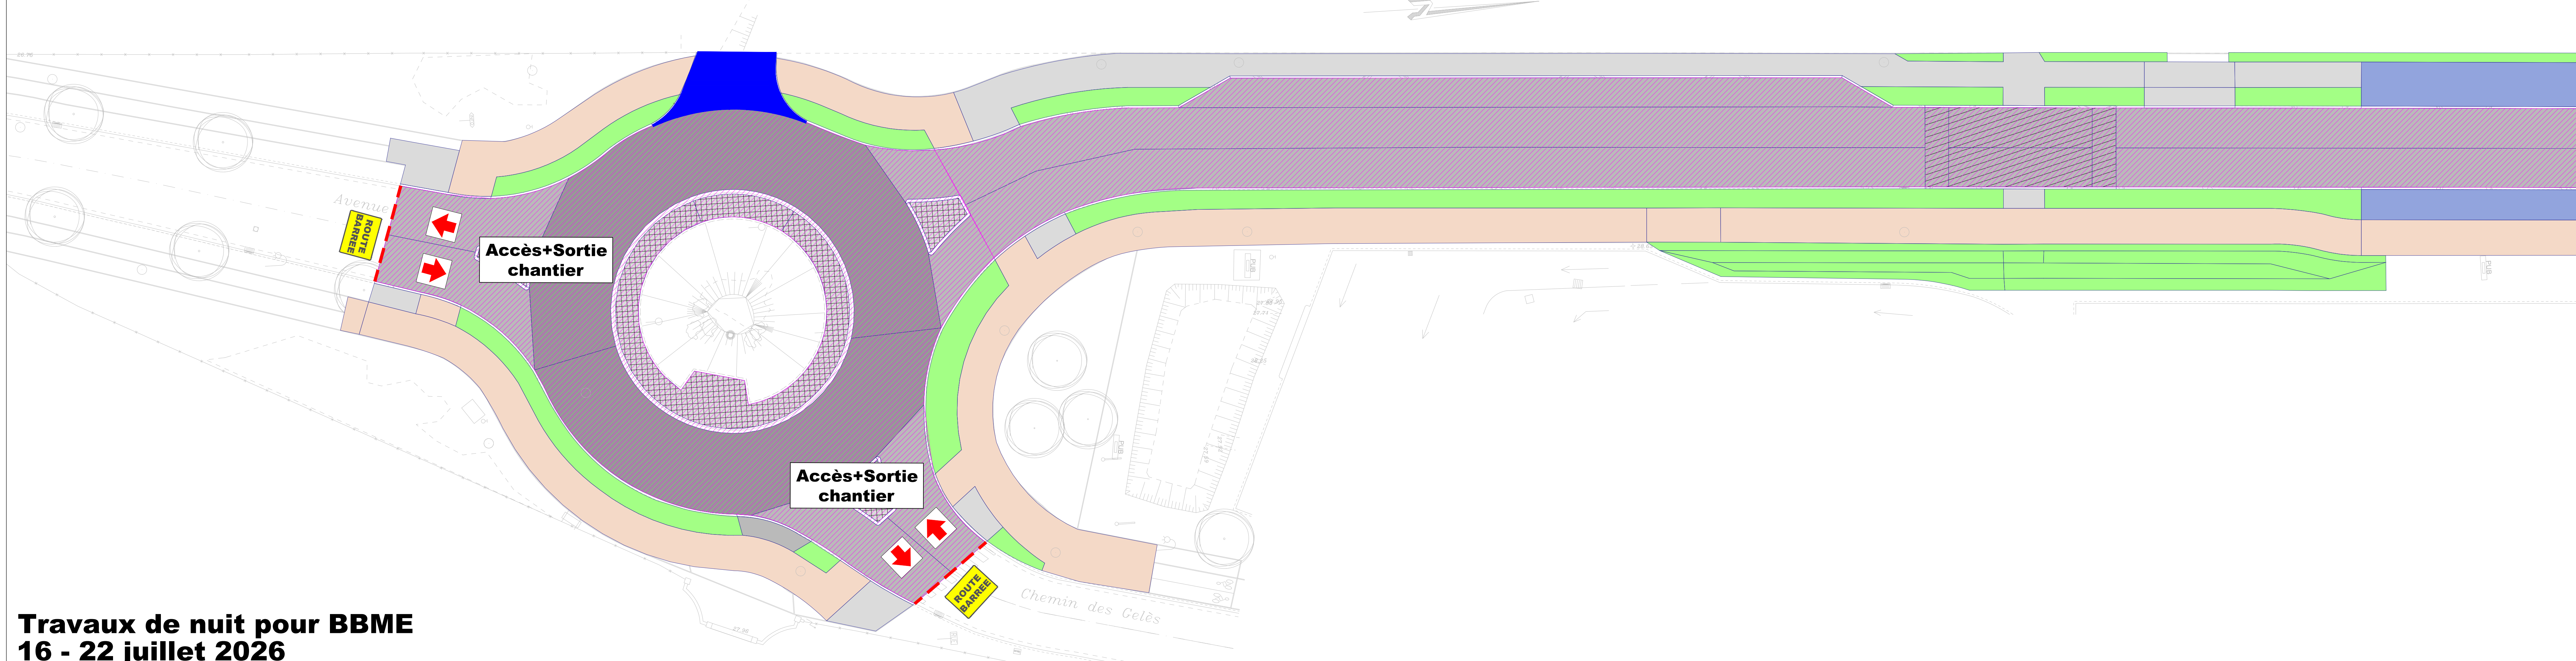


- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

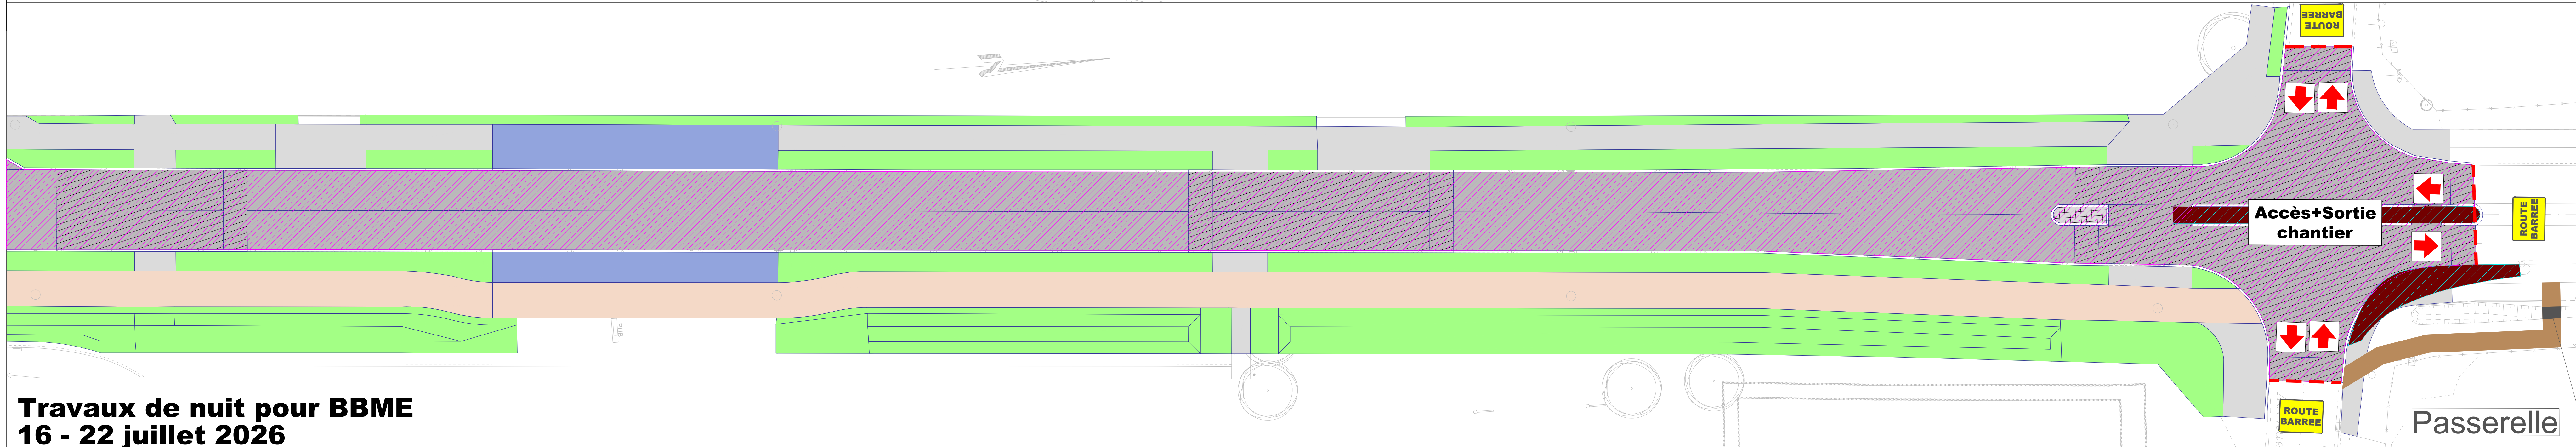


**Travaux de nuit pour BBME  
16 - 22 juillet 2026**

Date	Modifications
A 11/02/26	Edition initiale

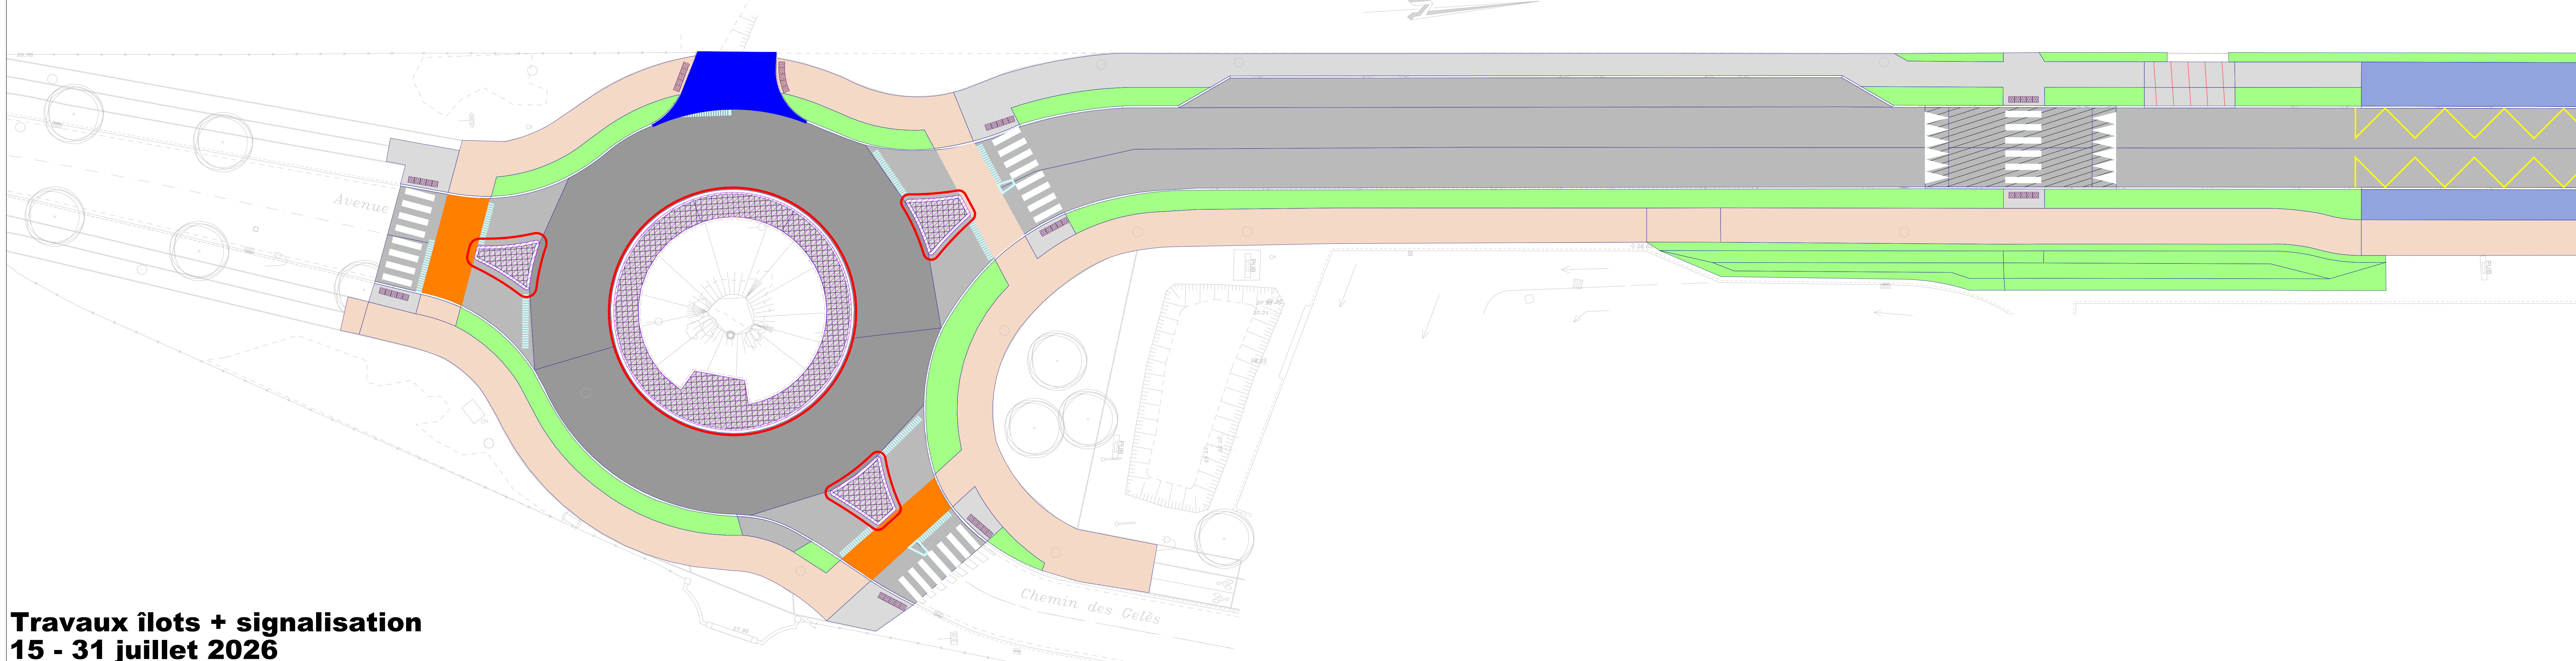

**Travaux îlots + signalisation**  
**15 - 31 juillet 2026**

- Emprise du chantier
- Accès chantier à conserver
- Enrobé provisoire
- Cheminement piéton calcaire
- Barrière chantier 1.10m
- Balisettes K5C
- Circulation
- Cheminement piétons/vélos
- Marquage provisoire
- Portail

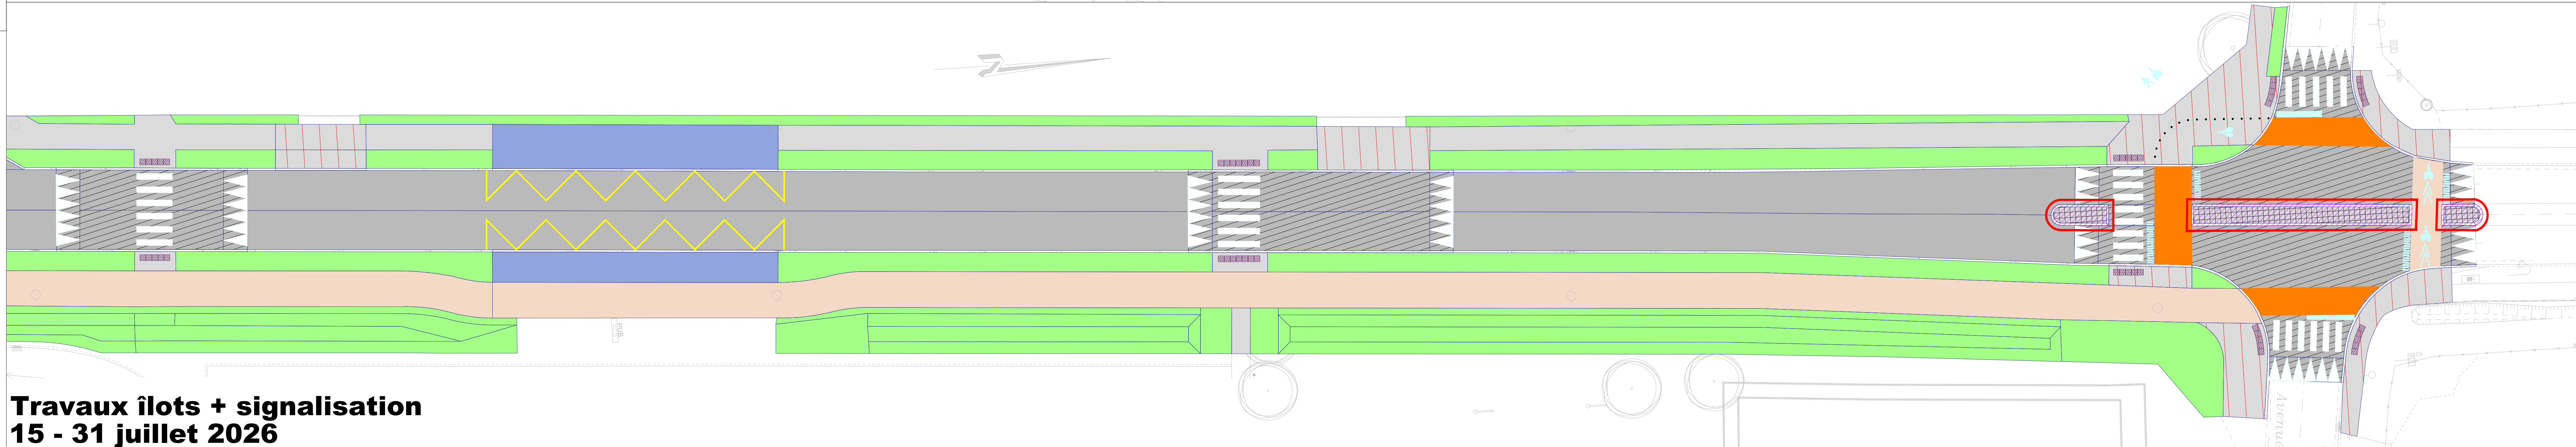

**Travaux îlots + signalisation**  
**15 - 31 juillet 2026**

